

PROBLEMATYKA POSTĘPOWANIA KONCESYJNEGO

PROJEKT NOWA RUDA WĘGIEL KOKSUJĄCY


W niniejszej infografice przedstawiono podstawowe dane na temat toczącego się postępowania koncesyjnego dla **Złoza Nowa Ruda**.

W momencie składania wniosku o przyznanie koncesji do Ministerstwa Środowiska spodziewano się, że cały proces zajmie **około pół roku** - założenie to oparto o zapisy obowiązującego prawa i przewidziane w nich terminy, oraz o toczące się w latach wcześniejszych przebiegi postępowań koncesyjnych na wydobycie węgla kamiennego przez Spółki Skarbu Państwa.

W rzeczywistości postępowanie toczy się już od 2 lat w niesprzyjającym środowisku administracyjnym - na drodze do koncesji **trzykrotnie** zmieniał się Rząd RP, a co za tym idzie - resort odpowiedni do spraw Środowiska obejmowało **aż czterech** Ministrów. W 2019 roku doszło do **całkowitej reorganizacji** Ministerstwa. Ponadto, **dwukrotnie** odwoływano Głównego Geologa Kraju (z długimi okresami nieobsadzenia stanowiska).

Pomimo skompletowania przez Spółkę prawie **2000 dokumentów, opinii, zatwierdzeń i decyzji, sześciokrotnego złożenia dodatkowych wyjaśnień i kompletów dokumentów** wnioskowanych przez Organ Koncesyjny, ciągłej wymiany korespondencji pocztowej (15 wystawianych pism), mailowej (kilkadziesiąt e-maili), telefonicznej (ponad 100 telefonów) oraz kilkukrotnych konstruktywnych spotkań z Sekretarzem Stanu Ministerstwa i aktualnym Głównym Geologiem Kraju, wniosek o przyznanie Balamarze koncesji w dalszym ciągu nie doczekał się pozytywnej decyzji.

OBJAŚNIENIA do harmonogramu czasowego

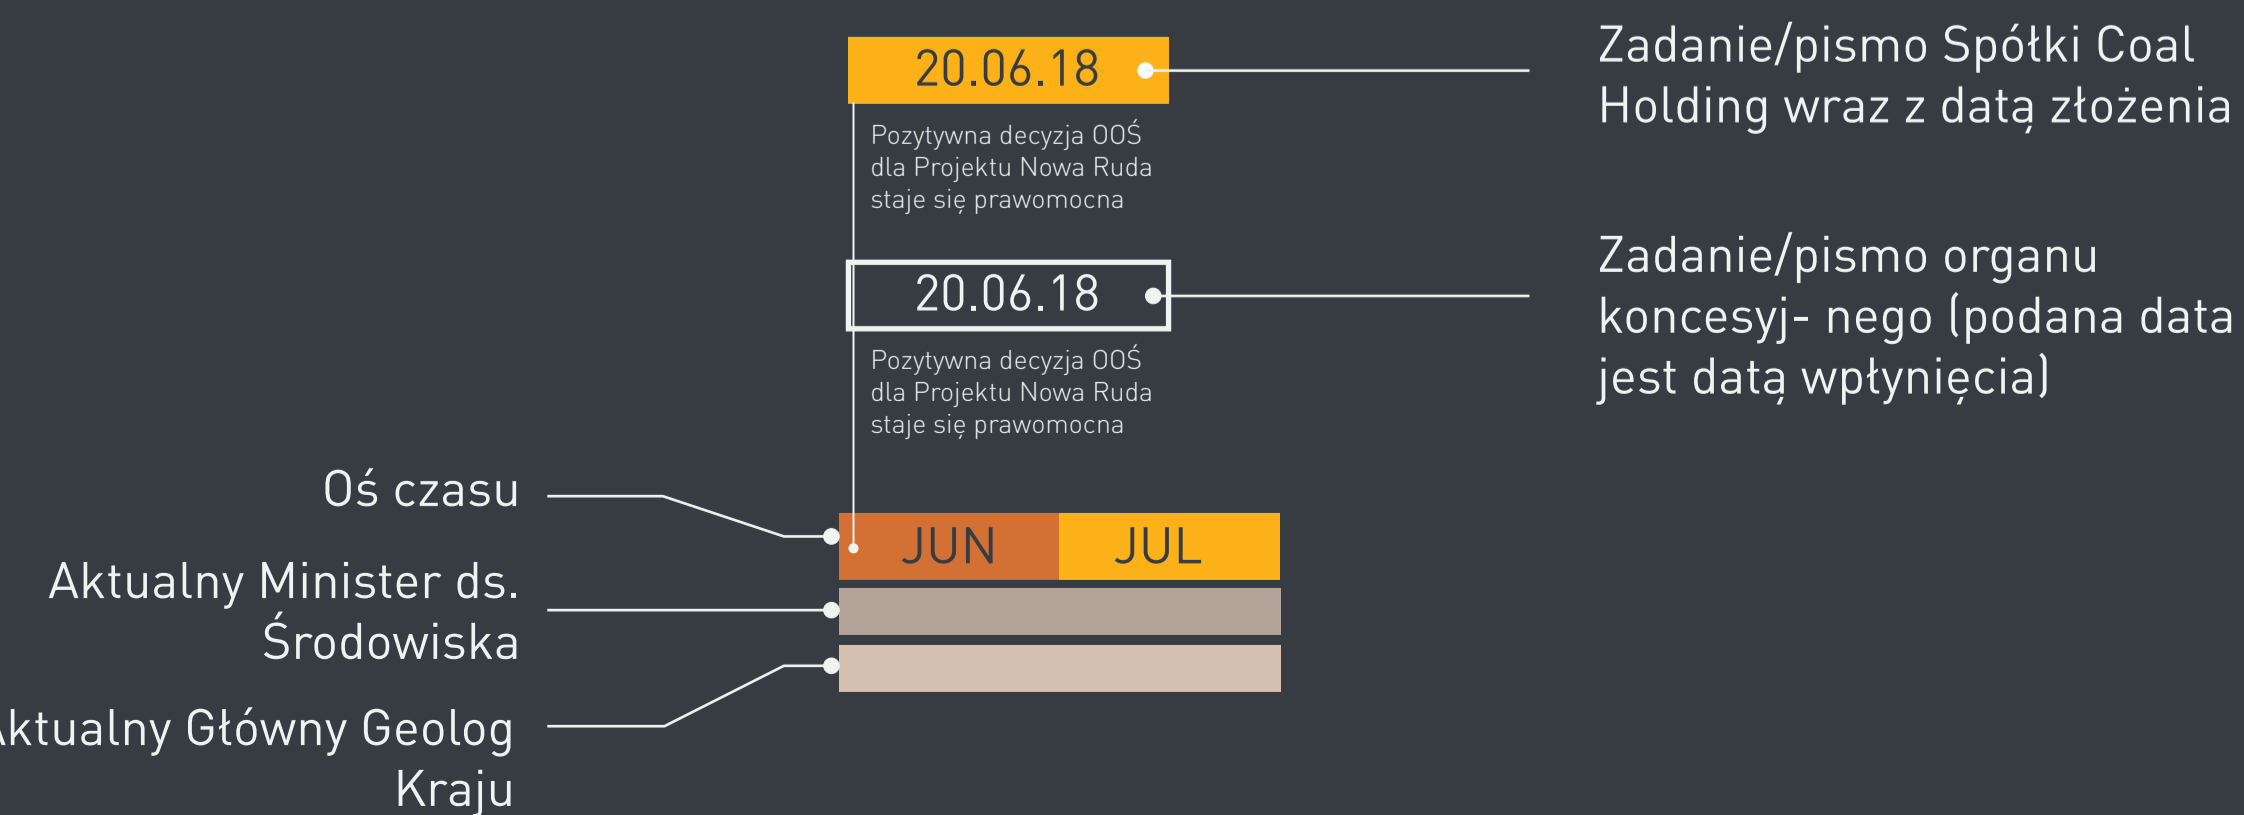

Wzorcowy model procesu koncesyjnego

przewidywany czas trwania procesu:


6 MIESIĘCY

Przewidywany na początku przebieg procesu koncesyjnego. Daty poszczególnych etapów oparto poprzez analogię do wcześniejszych postępowań koncesyjnych Spółek Skarbu Państwa oraz terminów wyznaczanych przez odpowiednie przepisy prawa




Czasy trwania procesów koncesyjnych w Polsce

w miesiącach od daty złożenia wniosku

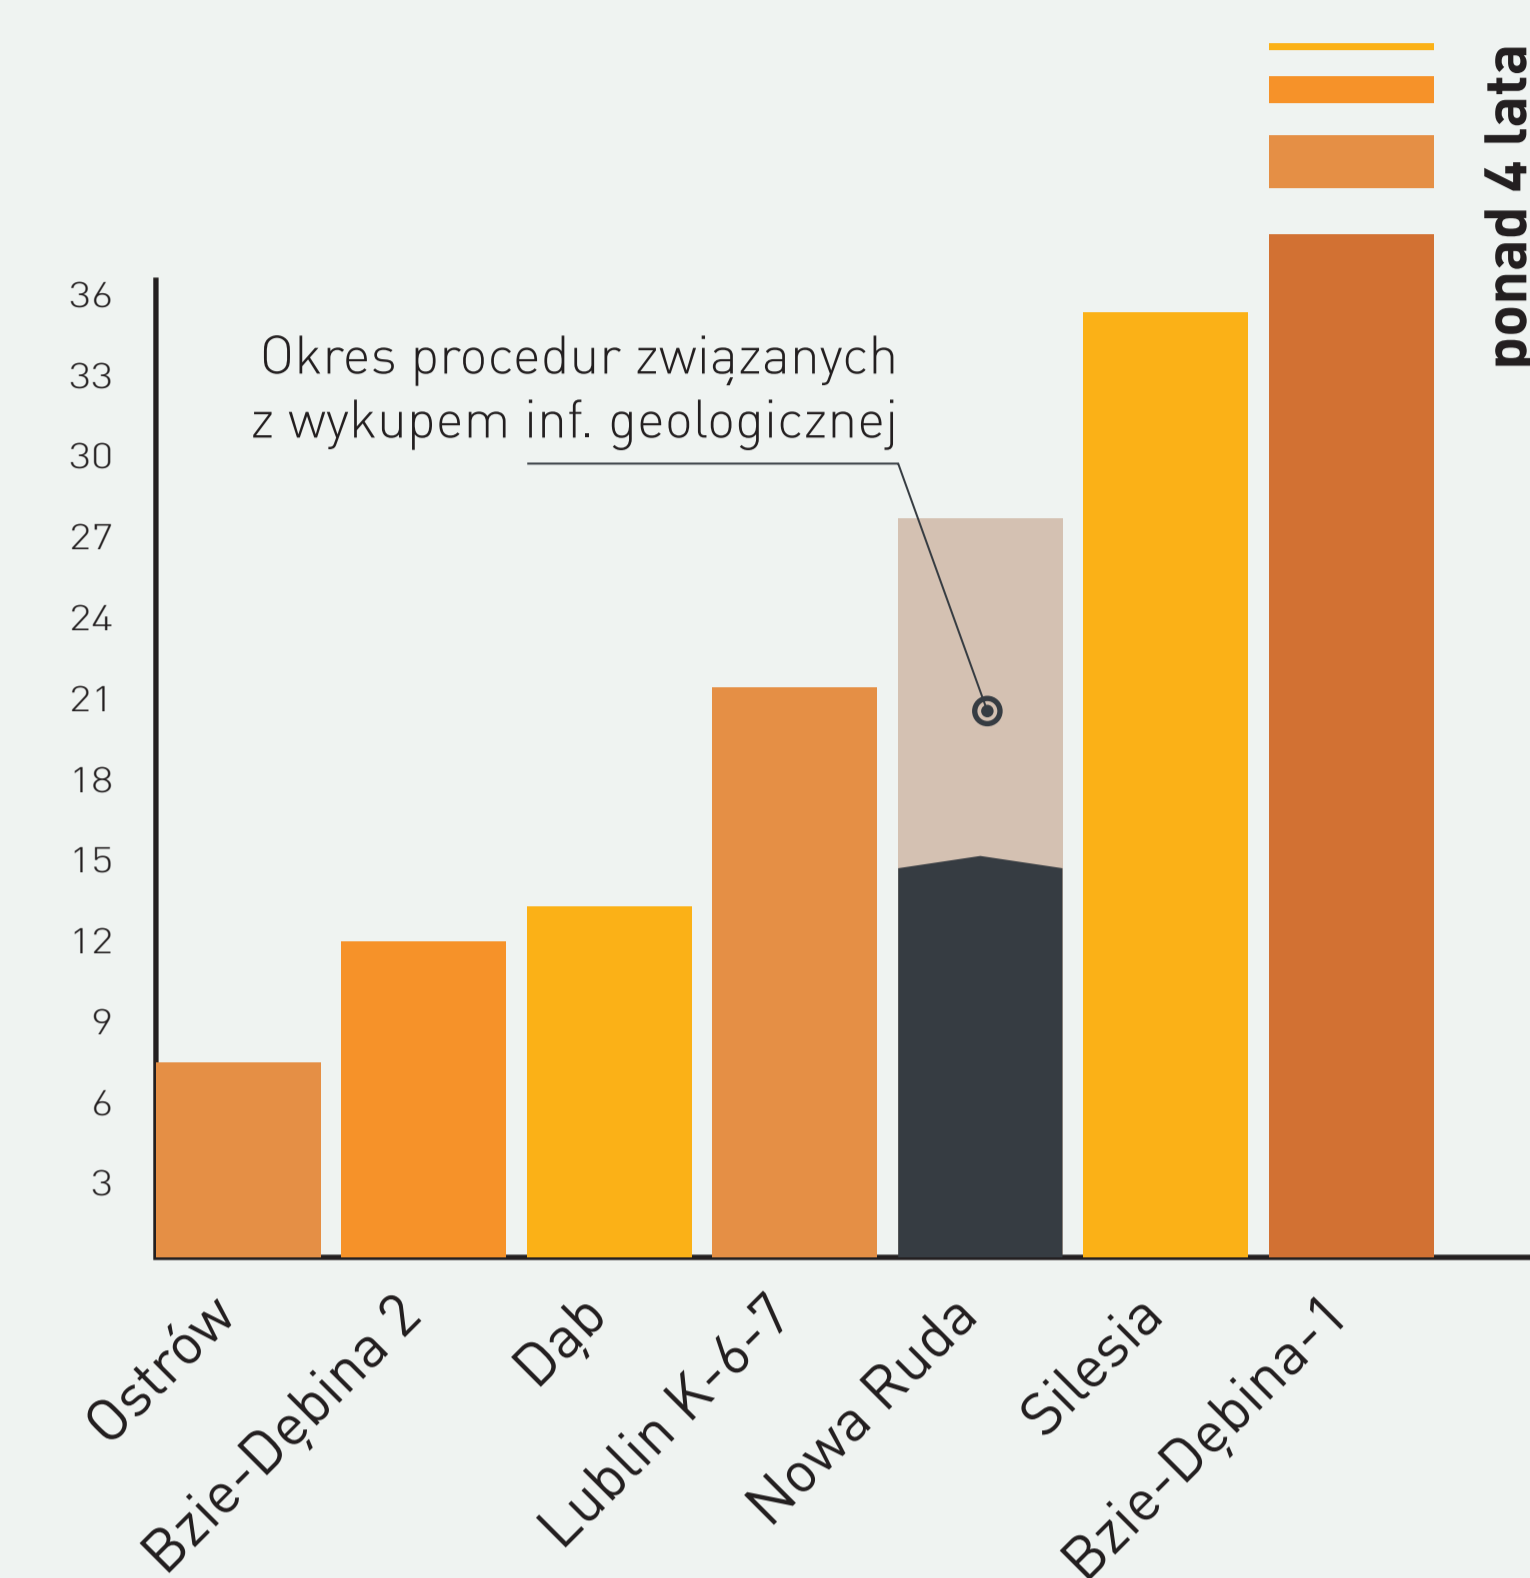

Czasy trwania postępowań koncesyjnych dla złoże węgla kamiennego w Polsce w ostatnich latach w porównaniu z procesem Nowa Ruda Uwaga: Szara część słupka oznacza okres 12 miesięcy braku skuteczności Ministerstwa w przygotowaniu i podpisaniu umowy na korzystanie z historycznej inf. geologicznej za wynagrodzeniem

Rzeczywisty przebieg procesu koncesyjnego

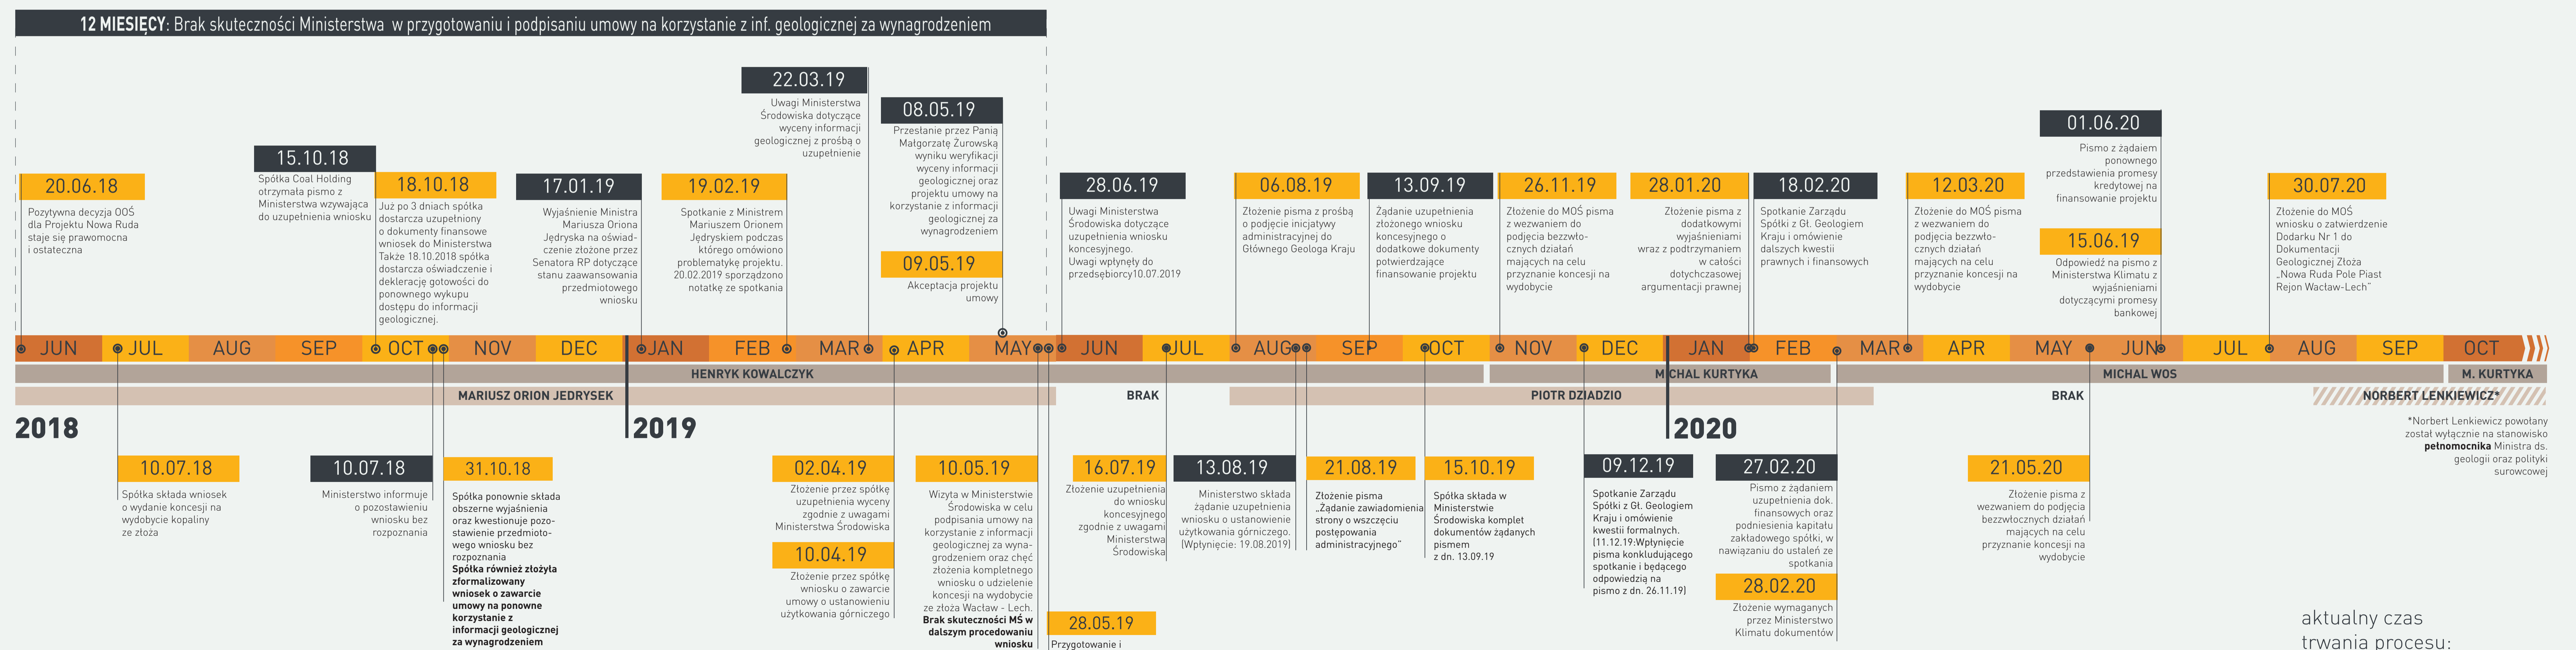

*Norbert Lenkiewicz powołany został wyłącznie na stanowisko **pełnomocnika** Ministra ds. geologii oraz polityki surowcowej

aktualny czas trwania procesu:

28 MIESIĘCY


Proces koncesyjny NOWA RUDA w liczbach

OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA PROCESU KONCESYJNEGO:

uptynęło **28 MIESIĘCY**

W TYM CZASIE SPÓŁKA:

uzyskała i skompletowała:



ponad **100 DECYZJI, UZGODNIEŃ I OPINII**

złożono w sprawie **15 OFICJALNYCH PISM**

wykonała:




ponad **100 TELEFONÓW DO MINISTERSTWA**

na drodze do złożenia wniosku wykonano prawie


2000 DOKUMENTÓW, OPRACOWAŃ, RAPORTÓW I ANALIZ

wystała:



KILKADZIESIĄT E-MAILI DO MINISTERSTWA

odbyła:



ponad **10 SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI MINISTERSTWA**
